



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минфин Ульяновской области)

Раднешева ул., д. 1, г. Ульяновск, 432017, тел./факс (8422) 44-06-99/44-01-23, E-mail: fin-upr@ufo.ulntc.ru
ОКПО 02297300, ОГРН 1027301178860, ИНН/КПП 7325001151/732501001

29.07.2015

№ 32

г. Ульяновск

АКТ

проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидий, предоставленных в 2014 году из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

Основание для проверки: План контрольных мероприятий Министерства финансов Ульяновской области по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчётности о реализации государственных программ Ульяновской области, в том числе отчётности об исполнении государственных заданий на 2015 год, утверждённый Министром финансов Ульяновской области 12.12.2014, распоряжение Министерства финансов Ульяновской области от 03.07.2015 № 172-р «О проведении проверки», удостоверение на право проведения проверки от 03.07.2015 № 20

Цель: проверить соблюдение целей и условий предоставления субсидий на реконструкцию и проведению ремонтно-реставрационных работ зданий, укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Объект проверки: муниципальное казённое учреждение культуры «Районный дом культуры» Карсунского района Ульяновской области (далее – МКУК «РДК»)

Юридический адрес: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул.Октябрьская д. 12 тел. 8 (84246) 2-49-99

ИНН/КПП: 7309903064/730901001

Проверяемый период: 2014 год

004267

*И.О. министра
финансов в области*

Копия Карсун
И.В. Карсун

Проверка проведена главным консультантом департамента государственного финансового контроля Министерства финансов Ульяновской области Д.В.Золотарёвым, ведущим консультантом департамента государственного финансового контроля Министерства финансов Ульяновской области Е.Н.Лучинкиной

Срок проверки: начало проверки 06 июля 2015 года
окончание проверки 17 июля 2015 года

1. Общие сведения о МУК «РДК»

МКУК «РДК» осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального казённого учреждения культуры «Районный дом культуры» Карсунского района Ульяновской области, утверждённого постановлением Администрации муниципального образования «Карсунский район» от 01.11.2011 № 889.

МКУК «РДК» создано путём изменения типа муниципального учреждения культуры «Районный Дом культуры» Карсунского района в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Карсунский район» от 07.02.2011 №71 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Карсунский район».

Учредителем МКУК «РДК» и собственником имущества является муниципальное образование «Карсунский район» в лице администрации муниципального образования «Карсунский район». Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» (далее – Управление по делам культуры).

МКУК «РДК» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки и штампы.

В своём составе МКУК «РДК» имеет 31 филиал, в том числе Уразовский сельский дом культуры (далее СДК).

В проверяемом периоде и по настоящее время право первой подписи денежных и расчётных документов в МКУК «РДК» принадлежит директору Музурову Вячеславу Владимировичу (приказ отдела по делам культуры и организации досуга населения от 2.02.2006 №4).

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МКУК «РДК» осуществляется Управлением по делам культуры на основании договора от 01.01.2014 №б/н, согласно которому право второй подписи денежных и расчётных документов принадлежит главному бухгалтеру Прониной Наталье Алексеевне.

МКУК «РДК» в Управлении финансов муниципального образования «Карсунский район» открыт лицевой счёт получателя бюджетных средств № 03558130087.

Юлия Верина
д.о. инструктора
финансовый отдел *Ю.В. Кожанов*

2 Объём доведённых лимитов бюджетных обязательств. Фактические объёмы и сроки финансирования.

Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы, утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414–П (далее – ГП «Развитие культуры в Ульяновской области»).

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014–2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 29.11.2013 № 1076.

Управлением по делам культуры до МКУК «РДК» доведены лимиты бюджетных обязательств уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств:

- от 30.01.2014 № 4461 на сумму 2 000 000,00 рублей по КЦСР 870 40 03 (средства областного бюджета),
- от 30.01.2014 №2564 на сумму 138 270,00 рублей по КЦСР 871 61 80 (средства местного бюджета).

В 2014 году в рамках реализации мероприятий ГП «Развитие культуры в Ульяновской области» МКУК «РДК» приняты бюджетные обязательства на основании заключенных муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 1 363 612,88 рублей, в том числе:

- от 02.02.2014 № 1 на сумму 53 740,00 рублей с ООО «Рубин» на монтаж автоматической пожарной сигнализации;
- от 20.02.2014 №248183 на сумму 1 067 066,88 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по проведению ремонта здания сельского дома культуры (далее – СДК), расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с.Уразовка, ул. Новая, д. 29а;
- от 12.05.2014 №1 на сумму 99 520,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по ремонту фасада здания СДК;
- от 26.05.2014 №2 на сумму 99 700,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по ремонту ограждения СДК;
- от 02.06.2014 №6 на сумму 43 586,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по ремонту кабинетов СДК.

Кассовые расходы по оплате ремонтно–реставрационных работ составили 2 138 270,30 рублей, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета - 2 000 000,00 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2013 год – 735 904,42 рублей;
- за счёт средств местного бюджета – 138 270,30 рублей.

Юлия Буца

И.О. Мещеряков

финансов областного К.В. Кожанов

3. Наличие утверждённой проектно–сметной документации, экспертизы проектно–сметной документации, муниципального контракта (договора подряда) на проведение ремонтно–строительных работ, исполнительной производственно–технической документации. Обоснованность составления локальных сметных расчётов на выполнение ремонтно–строительных работ. Соответствие выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта (договора). Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учёта выполненной работы (её результата) или оказанной услуги. Проведение контрольных обмеров. Соответствие использования выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

В рамках реализации мероприятий ГП «Развитие культуры в Ульяновской области» МКУК «РДК» заключены муниципальные контракты и договора на общую сумму 1 363 612,88 рублей, в том числе:

- от 02.02.2014 № 1 на сумму 53 740,00 рублей с ООО «Рубин» на монтаж автоматической пожарной сигнализации;
- от 20.02.2014 №248183 на сумму 1 067 066,88 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по проведению ремонта здания сельского дома культуры (далее – СДК), расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с.Уразовка, ул. Новая, д. 29а;
- от 12.05.2014 №1 на сумму 99 520,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по ремонту фасада здания СДК;
- от 26.05.2014 №2 на сумму 99 700,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по ремонту ограждения СДК;
- от 02.06.2014 №6 на сумму 43 586,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по ремонту кабинетов СДК.

К муниципальным контрактам и договорам подряда представлены следующие документы:

- 1) локальные сметы:
 - № ЛС-01 «Ремонт в здании Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области. Фойе и вспомогательные помещения» на общую сумму 1 067 066,88 рублей,
 - № 12 «Ремонт в здании Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области. Автоматическая пожарная сигнализация» на общую сумму 53 740,00 рублей,
 - № ЛС-806 «Ремонт кабинетов Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области» на сумму 43 586,00 рублей,
 - № ЛС-444 «Ремонт ограждения Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области» на сумму 99 700,00 рублей;
- 2) акты о приёмке выполненных работ формы КС–2:
 - № 1 от 05.05.2014 за период с 20.02.2014 по 05.05.2014 на общую сумму 1 067 066,88 рублей,

Юлия Верна
И.О. Миткогоря
финансовый облдел И.В. Козлов

- № 4 от 25.06.2014 за период с 02.06.2014 по 25.06.2014 на общую сумму 43 586,00 рублей,

- № 3 от 09.06.2014 за период с 26.05.2014 по 09.06.2014 на общую сумму 99 700,00 рублей;

4) положительная экспертиза сметной документации по ремонту здания Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области от 06.12.2013 № 717, выданная ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа».

МКУК «РДК» приняты к оплате и оплачены акты о приёмке выполненных работ формы КС-2 на общую сумму 1 264 092,88 рублей. Оплата произведена на основании справок о стоимости работ формы КС-3 платёжными поручениями на общую сумму 1 264 092,88 рублей.

При анализе представленной документации, унифицированных форм первичной учётной документации, визуальном осмотре и выборочных контрольных замерах выполненных работ выявлены нарушения на сумму **85 543,00** рублей:

✓ **По локальной смете № ЛС-01 «Ремонт в здании Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области. Фойе и вспомогательные помещения»**, муниципальный контракт от 20.02.2014 № 248183 на сумму 1 067 066,88 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» (акт о приёмке выполненных работ от 05.05.2014 № 1 на сумму 1 067 066,88 рублей):
по разделу проёмы:

- по акту приняты работы по установке в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2 кв.м. 23,76 кв.м. фактически выполнены работы площадью 22,09 кв.м., завышение объёмов составило 1,67 кв.м. на сумму **7 343,00** рублей (приложение № 1);

- по акту приняты работы по установке подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. в количестве 13,5 м. фактически выполнены работы в количестве 11,77 пм., завышение объёмов составило 1,73 пм. на сумму **1 250,00** рублей (приложение № 2);

- по акту приняты работы по смене обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 13,5 пм фактически выполнены работы в количестве 11,77 пм, завышение объёмов составило 1,73 пм на сумму **445,00** рублей (приложение № 3);

- по акту приняты работы по установке блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3 кв.м. площадью 22,0 кв.м. фактически выполнены работы площадью 18,97 кв.м., завышение объёмов составило 3,03 кв. м. на сумму **5 938,00** рублей (приложение № 4);

*Юлия Верина
И.О. министра
финансов области К.В. Кожаков*

– по акту приняты работы по улучшенной масляной окраске по дереву дверных блоков площадью 52,8 кв.м. фактически выполнены работы площадью 37,94 кв.м., завышение объёмов составило 14,86 кв.м. на сумму **1 557,00** рублей (приложение № 5);

– по акту приняты работы по облицовке гипсоволокнистыми листами откосов дверных проёмов площадью 14,0 кв.м. фактически выполнены работы площадью 10,6 кв.м., завышение объёмов составило 3,4 кв.м. на сумму **2 510,00** рублей (приложение № 6);

– по акту приняты работы по шпатлёвке по сборным конструкциям откосов дверных проёмов площадью 14,0 кв.м. фактически выполнены работы площадью 10,6 кв.м., завышение объёмов составило 3,4 кв.м. на сумму **198,00** рублей (приложение № 7);



– по акту приняты работы по улучшенной окраске поливинилацетатными водоземulsionными составами площадью 14,0 кв. м. фактически выполнены работы площадью 10,6 кв.м., завышение объёмов составило 3,4 кв.м. на сумму **563,00** рублей (приложение № 8);

по разделу отделочные работы:

– по акту приняты работы по устройству подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 150 кв.м. фактически выполнены работы площадью 148,82 кв.м., завышение объёмов составило 1,18 кв.м. на сумму **889,00** рублей (приложение № 9);

– по акту приняты работы по окрашиванию водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% площадью 390,0 кв.м. фактически выполнены работы площадью 305,38 кв.м., завышение объёмов составило 84,62 кв.м. на сумму **13 934,00** рублей (приложение № 10);

по разделу полы:

– по акту приняты работы по устройству стяжек цементных толщиной 20 мм площадью 40 кв.м. фактически выполнены работы площадью 31,22 кв.м., завышение объёмов составило 8,78 кв.м. на сумму **1 908,00** рублей (приложение № 11);

– по акту приняты работы по устройству покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных площадью 40 кв.м. фактически выполнены работы площадью 36,12 кв.м., завышение объёмов на 3,88 кв.м. на сумму **3 866,00** рублей (приложение № 12);


*Томия Верия
И.О. Генерала
финансов области Ю.В. Корюков*

– по акту приняты работы по устройству плинтусов из плиток керамических в количестве 37 м фактически выполнены работы в количестве 29,6 м, завышение объёмов составило 7,4 м на сумму **1 936,00** рублей (приложение № 13);

– по акту приняты работы по устройству покрытий из линолеума на клее КН-2 площадью 36,0 кв.м. фактически выполнены работы площадью 19,68 кв.м., завышение объёмов составило 16,32 кв.м. на сумму **9 787,00** рублей (приложение № 14);

– по акту приняты работы по устройству плинтусов деревянных в количестве 85 м фактически выполнены работы в количестве 75,6 м, завышение объёмов составило 9,4 м на сумму **537,00** рублей (приложение № 15);

– по акту приняты работы по устройству плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 в количестве 28 м фактически данные работы не выполнены, завышение объёмов составило 28 м на сумму **2 743,00** рублей (приложение № 16).

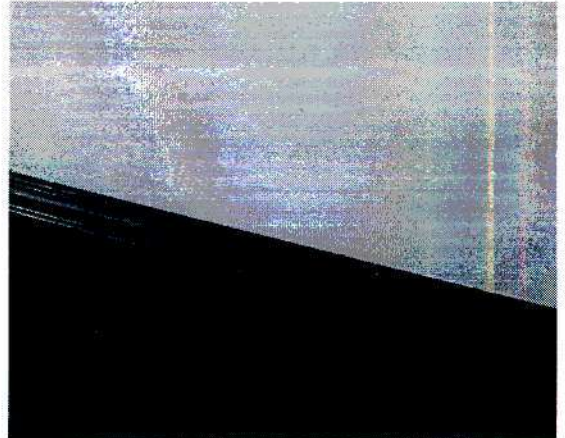

по разделу электромонтажные работы:

– по акту приняты работы по установке светильников в подвесных потолках с количеством ламп в светильнике до 4 в количестве 24 шт. фактически выполнены работы в количестве 20 шт., завышение объёмов составило 4 шт. на сумму **6 725,00** рублей (приложение № 17);

✓ **По локальной смете № 12 «Ремонт в здании Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области. Автоматическая пожарная сигнализация»**, муниципальный контракт от 02.02.2014 № 1 на сумму 53 740,00 рублей с ООО «Рубин» (акт выполненных работ от 25.06.2014 № 10) все работы выполнены в полном объёме и в установленные данным контрактом сроки.

✓ **По локальной смете № ЛС-806 «Ремонт кабинетов Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области»**, договор подряда от 02.06.2014 № 6 на сумму 43 586,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» (акт выполненных работ от 25.06.2014 № 4 на сумму 43 586,00 рублей)

– по акту приняты работы по окраске клеевыми составами площадью 35,0 кв.м. фактически данные работы не выполнены, завышение объёмов составляет 35,0 кв.м. на сумму **2 088,00** рублей (приложение № 18);

*Жокия Верна
И.О. Искитова
финансовый отдел И.В. Карахъв*

– по акту приняты работы по оклейке обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными площадью 36,5 кв.м. фактически данные работы не выполнены, завышение объёмов составляет 36,5 кв.м. на сумму **11 838,00** рублей (приложение № 19);

– по акту приняты работы по устройству плинтусов деревянных в количестве 14,0 м. фактически данные работы не выполнены, завышение объёмов составляет 14,0 кв.м. на сумму **824,00** рублей (приложение № 20);

– по акту приняты работы по окраске масляными составами по дереву полов площадью 35,0 кв.м. фактически данные работы не выполнены, завышение объёмов составляет 35,0 кв.м. на сумму **8 664,00** рублей (приложение № 21);

✓ **По локальной смете № ЛС-444 «Ремонт ограждения Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области»**, договор подряда от 26.05.2014 № 2 на сумму 99 700,00 рублей с ООО «Стройцентрмонтаж» (акт выполненных работ от 09.06.2014 № 3 на сумму 99 700,00 рублей) все виды работ выполнены в полном объёме и соответствуют акту выполненных работ.

Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» МКУК «РДК» приняты к учёту первичные учётные документы, которыми оформлены не имевшие место факты хозяйственной жизни, что повлекло за собой неправомерную оплату неподтверждённых объёмов работ и неиспользованных материалов на сумму **85 543,00** рублей, в результате чего Ульяновской области причинён ущерб в указанном размере.

Кроме того, в период проведения ремонтных работ были произведены фактические изменения используемых материалов и объёмов работ на общую сумму **131 717,00** рублей без отражения в актах о приёмке выполненных работ, а именно:

✓ **по локальной смете ЛС-01 «Ремонт в здании Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области. Фойе и вспомогательные помещения»** (акт выполненных работ от 05.05.2014 № 1 на сумму 1 067 066,88 рублей):

по разделу проёмы:

– по акту приняты работы по установке оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проёма более 2 кв.м. трёхстворчатых площадью 22,09 кв.м. на сумму **97 026,00** рублей (приложение № 22), фактически три оконных блока данной площадью являются одно- и двухстворчатыми площадью до 2 кв.м.;

*Юлия Верина
И.О. Митяева
руководитель области Ю.В. Кудряков*

– по акту приняты работы по улучшенной масляной окраске по дереву дверных блоков площадью 37,94 кв.м. соответственно на общую сумму **3 833,00** рублей (приложение № 23), фактически данные работы заменены на работы по окраске дверных блоков лаком;

– по акту приняты работы по улучшенной окраской поливинилацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям стен площадью 10,6 кв. м. на общую сумму **1 709,00** рублей (приложение № 24), фактически данные работы заменены на работы по окраске масляными составами.

по разделу отделочные работы:

– по акту приняты работы по подшивке потолков кровельной оцинкованной сталью по дереву площадью 15 кв.м. соответственно на общую сумму **5 754,00** рублей (приложение № 25), фактически данные работы заменены на работы по подшивке потолков металлическим профилированным листом.

✓ по локальной смете № ЛС-806 «Ремонт кабинетов Уразовского СДК Карсунского района Ульяновской области» (акт выполненных работ от 25.06.2014 № 4 на сумму 43 586,00 рублей)

– по акту приняты работы по окраске клеевыми составами площадью 35,0 кв.м. на общую сумму **2 088,00** рублей (приложение № 26), фактически заменены на работы по оклейке потолков простыми обоями;

– работы по оклейке обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными площадью 36,5 кв.м. на общую сумму **11 838,00** рублей (приложение № 27), фактически заменены на работы по окраске стен поливинилацетатными вододисперсионными составами.

– по акту приняты работы по устройству плинтусов деревянных в количестве 14 м на общую сумму **805,00** рублей (приложение № 28), фактически заменены на работы по устройству плинтусов поливинилхлоридных;

– по акту приняты работы по окраске масляными составами по дереву полов площадью 35 кв.м. на общую сумму **8 664,00** рублей (приложение № 29), фактически заменены на работы по устройству покрытий из линолеума.

Согласно пунктам 2.5., 6.2. муниципального контракта от 20.02.2014 № 248183, пункту 9.2 договора подряда от 02.06.2014 № 6 заказчик может изменить условия контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон.

Пунктом 9.4 муниципального контракта от 20.02.2014 № 248183 предусмотрено, что «все изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся путем заключения дополнительного соглашения, являющегося его

*Юлия Верна
И.О. Митрофанова
Сриканеев области Карсунский*

неотъемлемой частью». На момент проверки МКУК «РДК» не представлено соглашение об изменении условий настоящего договора в части изменения объема выполняемых работ.

Кроме того, пунктами 1 и 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что исполнение договора включает в себя комплекс мер, направленных на достижение целей осуществления закупки, в том числе приёмку и оплату заказчиком выполненной работы (ее результатов), предусмотренной данным договором, с проведением экспертизы предоставленных подрядчиком результатов в части их соответствия условиям настоящего договора.

Таким образом, в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 9.4 муниципального контракта от 20.02.2014 № 248183 с ООО «Стройцентрмонтаж» на выполнение работ по проведению ремонта здания Уразовского СДК», расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Уразовка, ул. Новая, д. 29а, в установленном порядке не оформлены изменения условий контракта, при исполнении контракта приняты и оплачены работы и материалы, отличные от фактически выполненных, без отражения в первичных учётных документах, на сумму **131 717,00** рублей.

Работы по проведению ремонта здания Уразовского СДК, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Уразовка, ул. Новая, д. 29а, выполнены в срок.

4. Заключительная часть

Проверкой соблюдения целей и условий предоставления субсидий, предоставленных в 2014 году из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, проведённой в муниципальном казённом учреждении культуры «Районный дом культуры» Карсунского района Ульяновской области установлены нарушения на общую сумму 217 260,00 рублей, в том числе:

1) **неправомерное использование субсидий**, выразившееся в принятии к учёту первичных учётных документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, что повлекло за собой неправомерную оплату неподтверждённых объёмов работ и неиспользованных материалов на сумму **85 543,00** рублей в результате чего, Ульяновской области причинён ущерб в указанном размере;

Юлия Вуина
И.О. заместителя
финансов области Ю.В. Караков

2) прочее нарушение, выразившееся в несоблюдении условий договора, именно в отсутствии документального оформления изменений объемов работ, видов работ и используемых материалов на сумму 131 717,00 рублей.

Главный консультант департамента
государственного финансового
контроля Министерства финансов
Ульяновской области



Д.В.Золотарёв

Ведущий консультант отдела
расходов областного бюджета
Министерства финансов
Ульяновской области



Е.Н. Лучинкина

«29» июля 2015 года

Татьяна Верина
И.О. заместителя
губернатора области Н.В. Кудряков
